

Investicijų plano rengėjas  
UAB AF-Consult, įm. k. 135744077, adresas Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, el. pašto adresas  
info.lt@afconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529

DAUGIABUČIO NAMO Melioratorių g. 3 (Joniškis) ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)  
PROJEKTAS

**DALIS: EKONOMINĖ – NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS**

2017 m. vasario 13 d.  
Joniškis

Investicijų plano rengimo vadovas:

Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062, išduotas 2012-11-29

(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai:

Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062

Užsakovas: UAB "Joniškio butų ūkis"

.....  
(žyma „pritariu“, juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė,  
parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)

Suderinta:

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Suderinta:

Būsto energijos taupymo agentūra

.....  
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

## I. AŠKINAMASIS RAŠTAS

Šio investicijų plano esmė – pagal pastato fizinės būklės duomenis įvertinti pastato esamos būklė energinių naudingumą, numatyti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, apskaičiuoti jų suminį energinį efektyvumą, numatyti preliminarią šių daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainą, pateikti investicijų ekonominį įvertinimą ir projekto finansavimo planą.

Investicijų planas atliekamas daugiabučiam gyvenamajam namui adresu Melioratorių g. 3, Joniškis. Pastato išorinės atitvaros nešiltintos, šildymo ir karšto vandens sistemos susidėvėję, veikia neefektyviai, dalis elementų pasenę, dalis butų bei visi bendrų patalpų langai seni, mediniai rėmais, nesandarūs, todėl pastato atnaujinimas yra būtinas. Investicijų plane siūlomos pastato atnaujinimo priemonės suteiks galimybę energiją pastate vartoti efektyviai, pastato gyventojams individualiai reguliuoti kiekvieno radiatoriaus šilumos atidavimą.

Investicijų planas rengiamas pagal šiuos dokumentus:

- Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas;
- Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės;
- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;
- Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos;
- Įvairių gamintojų rekomendacijos;
- Kiti dokumentai.

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano (toliau – Investicijų planas) užsakovas yra UAB "Joniškio butų ūkis". Investicijų planas atliekamas pagal 2016 m. gruodžio 14 d. sutartį „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos“, kurios registracijos numeris Nr. -.

Rengiamas investicijų planas atitinka Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-208 patvirtintą Joniškio miesto teritorijos bendrąjį planą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus.

Investicijų plano rengimo vadovas – Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062, adresas: Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, tel. 8-652-44529, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com,

rengėjas – Tomas Staškevičius, atestato Nr. 0062, adresas: Lvovo g. 25, 09320 Vilnius, tel. 8-652-44529, el. paštas: tomas.staskevicius@afconsult.com.

Atkreiptinas dėmesys, kad investicijų plane skaičiavimų rezultatai gali skirtis nuo realių dėl šių priežasčių:

- atnaujinimo priemonių įgyvendinimo kainos yra orientacinės, paremtos vidutinėmis investicijų plano atlikimo metu rinkoje vyraujančiomis kainomis, todėl gali skirtis nuo faktinių darbų atlikimo kainos;
- energijos išteklių kainos gali kisti, priklausomai nuo valstybės, savivaldybės politikos ar kitų faktorių;
- investicijų plane minimi darbų kiekiai yra preliminarūs ir jokiais būdais ne baigtiniai. Šie kiekiai turi būti tikslinami bei papildomi projekto atlikimo metu.

## II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

### 1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas): Stambiaplokštis;

1.2. aukštų skaičius: 5;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra): 1979;

- 1.4. namo energinio naudingumo klasė: KG-0424-01231, E klasė;  
 1.5. užstatytas plotas ( m<sup>2</sup>): 633;  
 1.6. namui priskirto žemės sklypo plotas (m<sup>2</sup>): - ;  
 1.7. atkuriamoji namo vertė, tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis): -.

## 2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eilės Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1.	<b>bendrieji rodikliai</b>			
2.1.1.	butų skaičius	vnt.	45	
2.1.2.	butų naudingasis plotas	m2	2320,50	
2.1.3.	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0	
2.1.4.	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m2	0,00	
2.1.5.	namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)	m2	2320,50	
2.2.	<b>Sienos</b>		stambiaplokštės	
2.2.1.	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m2	2375,40	
2.2.2.	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m2K	1,27	
2.2.3.	cokolio plotas	m2	388,00	
2.2.4.	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m2K	1,6	
2.3.	<b>stogas</b>		plokščias	
2.3.1.	stogo dangos plotas	m2	750	
2.3.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m2K	0,85	
2.4.	<b>butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys</b>			
2.4.1.	langų skaičius, iš jų:	vnt.	140	
2.4.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	123	
2.4.2.	langų plotas, iš jų:	m2	379,00	
2.4.2.1.	Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m2	329,20	
2.4.3.	balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt	45	
2.4.3.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris,skaičius	vnt.	37	
2.4.4.	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m2	80,00	
2.4.4.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m2	67,40	
2.5.	<b>bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys:</b>			
2.5.1.	langų skaičius, iš jų	vnt.	55	
2.5.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, skaičius	vnt	0	
2.5.2.	langų plotas, iš jų:	m2	68,00	
2.5.2.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos laidumo langus, plotas	m2	0,00	
2.5.3.	lauko durų skaičius	vnt	12	
2.5.4.	lauko durų plotas	m2	27,00	
2.6.	<b>rūsys</b>			

2.6.1.	rūsio perdangos plotas	m <sup>2</sup>	520,00	
2.6.2.	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m <sup>2</sup> K	0,71	

\*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

### 3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
3.1.	sienos (fasadinės)	3	Išorinės sienos – gelžbetonio blokų. Nešiltintos. Matomi išorinių sienų paviršiaus patamsėjimai dėl drėgmės skverbimosi į atitvarą.	2016-12-20, vizualinė apžiūra, Tomas Staškevičius (UAB AF-Consult), Martas Ginkus (UAB Joniško butų ūkis)
3.2.	pamatai ir nuogrindos	3	Pamatai - betono, nešiltinti. Drėgmė skverbiasi į atitvaros vidų.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.3.	stogas	3	Stogas plokščias, nešiltintas.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.3.	langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose	3	Dauguma butų langai bei balkonų durys – plastikiniai, dviejų stiklų. Kiti – seni, mediniais rėmais, nesandarūs.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.5.	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	3	Laikančiosios konstrukcijos – gelžbetonio blokų.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.6.	rūsio perdanga	3	Rūsio perdanga – gelžbetonio plokštė, nešiltinta.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.7.	langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose	2	Rūsio bei laiptinės langai – seni, mediniais rėmai. Lauko durys – metalinės.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.8.	šildymo inžinerinės sistemos	3	Šiluma ruošama pastato šilumos mazge. Šilumos mazgas – automatizuotas. Šildymo sistema – priklausoma, vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Radiatoriai – seni, sekcijiniai. Termostatinė ventiliacija nėra. Vamzdynų izoliacija susidėvėjusi arba jos visai nėra.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.9.	karšto vandens inžinerinės sistemos	3	Karštas vanduo ruošiamas pastato šilumos mazge. Sistema – uždara. Pastato karšto vandens sistemos magistralės atnaujintos, izoliuotos. Sistema nesubalansuota.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.10.	vandentiekio inžinerinės sistemos	3	Buitinis šaltas vanduo gaunamas iš miesto vandentiekio tinklo.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.11.	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	3	Buitinių nuotekų sistema – centrinė, nuotekos šalinamos į miesto nuotekų tinklą. Lietaus nuotekų sistema – vidinė.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.12.	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Vėdinimo sistema pastate – natūrali. Oro apykaita patalpose nepakankama.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.13.	elektros bendrosios inžinerinės sistemos	3	Elektros instaliacijos pastate būklė patenkinama.	Taip pat, kaip punkte 3.1.
3.14.	lifantai (jei yra)	nėra	-	
3.15.	kita	nėra	-	

\* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

## 4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2014-2016 metai.

3 lentelė

Eilės Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
4.1.1.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	kWh/metus kWh/m <sup>2</sup> /metus	518724,57 223,54	Pagal energinio naudingumo sertifikatą
4.1.2.	Namų energinio naudingumo klasė	Klasė	E	Tas pats
4.1.3.	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį	kWh/metus kWh/m <sup>2</sup> /metus	197240 85	
4.1.4.	4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3055,67	
4.1.5.	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui	kWh/dienolaipsniui	64,55	

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namų esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis:

4.2.1. pastato išorinės atitvaros (sienos, stogas, cokolis) yra ypač laidžios šilumai,

4.2.2. didelė dalis langų yra seni, mediniais rėmais, nesandarūs, laidūs šilumai,

4.2.3. pastato šildymo ir karšto vandens sistemos pasenę, dalinai susidėvėję, neefektyvios, nėra individualių šilumos atidavimo reguliavimo priemonių.

## 5. Numatomos įgyvendinti namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Investicijų plane pateikiami du atnaujinimo priemonių paketai.

4.1 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas I)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai			
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Investicijos priemonės įgyvendinimui	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m <sup>2</sup> K) *	Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m, vnt.)
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės				
5.1.1	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (1)	<p>Esama vienvamzdė šildymo sistema atnaujinama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-esami magistraliniai vamzdynai rūsyje izoliuojami nauja akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos danga,</li> <li>-šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Ant balansinių ventilių sumontuojamos terminės pavaros. Šalia balansinių ventilių sumontuojami paviršiniai temperatūros davikliai. Šilumos punkte sumontuojamas valdiklis, kuris sujungtas su terminėmis pavaromis ir paviršiniais temperatūros davikliais ir reguliuoja grįžtančių stovų vandens temperatūrą priklausomai nuo šilumos punkto paduodamos temperatūros;</li> <li>-šildymo sistemos daliklinės apskaitos sistemos įrengimas su duomenų kaupimu ir nuotoliniu nuskaitymu,</li> <li>-prie radiatorių įrengiami didelio pralaidumo dvieigiai ventiliai su termostatiniais reguliatoriais (užpildas - dujinis) bei apvado susiaurininimu. Radiatoriaus termostatai gamykliškai apriboti temperatūrų diapazone 16-23°C.</li> <li>Atliekamas sistemos praplovimas stovais, subalansavimas, balansavimo protokolų užpildymas bei stovų rūsyje sužymėjimas. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką.</li> </ul>	<p>Investicijų suma - 12966 Eur, iš to skaičiaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-šildymo sistemos magistralinių vamzdynų izoliacija, 2610 Eur</li> <li>-šildymo sistemos automatiniai balansiniai vožtuvai ir rutulinės sklendės, 1150 Eur</li> <li>-šildymo sistemos daliklinės apskaitos sistemos įrengimas su duomenų kaupimu ir nuotoliniu nuskaitymu, 6570 Eur</li> <li>-šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su reguliatoriais, 2336 Eur</li> <li>-sistemų subalansavimas, protokolų užpildymas, stovų sužymėjimas, 300 Eur</li> </ul>	-	<p>šildymo sistemos magistralinių vamzdynų izoliacija, 290 m., 9 Eur/m.,</p> <p>šildymo sistemos automatiniai balansiniai vožtuvai ir rutulinės sklendės, 23 kompl., 50 Eur/kompl.,</p> <p>šildymo sistemos daliklinės apskaitos sistemos įrengimas su duomenų kaupimu ir nuotoliniu nuskaitymu, 146 kompl., 45 Eur/kompl.,</p> <p>šildymo sistemos termostatiniai ventiliai su reguliatoriais, 146 kompl., 16 Eur/kompl.,</p> <p>sistemų subalansavimas, protokolų užpildymas, stovų sužymėjimas, 1 kompl., 300 Eur/kompl.,</p>
5.1.2	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų	Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.	<p>Investicijų suma - 1485 Eur, iš to skaičiaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis</li> </ul>	-	patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas, 45 but., 33 Eur/but.,

	pravalymas)		išvalymas, 1485 Eur		
5.1.3	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas... (tinkuojamas fasadas)	Atliekamas išorinių sienų bei cokolio šiltinimas iš išorinės pusės, įrengiant tinkuojamą fasadą. Defektų šalinimas. Šiltinimo įgilinimas 1,20 m. žemiau nuogrindos. Atnaujinama nuogrinda. Balkonų turėklinės plokštės atnaujinamos. Įrengimas bei savybės turi atitikti ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus. Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, kitus teisės aktus.	Investicijų suma - 178750,8 Eur, iš to skaičiaus: -sienos ir angokraščiai, 147274,8 Eur -cokolis, iki nuogrindos, 12028 Eur -cokolis, žemiau nuogrindos, 12028 Eur -balkonų turėklinės plokštės, 7420 Eur	<0,20 (įvertinus tvirtiklius)	sienos ir angokraščiai, 2375,4 m <sup>2</sup> , 62 Eur/m <sup>2</sup> , cokolis, iki nuogrindos, 194 m <sup>2</sup> , 62 Eur/m <sup>2</sup> , cokolis, žemiau nuogrindos, 194 m <sup>2</sup> , 62 Eur/m <sup>2</sup> , balkonų turėklinės plokštės, 140 m <sup>2</sup> , 53 Eur/m <sup>2</sup> ,
5.1.4	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą (...), apšiltinant ją arba perdangą pastogėje	Atliekamas plokščio stogo šiltinimas, keičiant esamą dangą nauja su termoizoliacijos plokštėmis, įrengiant bituminę dangą. Parapetų pakėlimas, šiltinimas. Žaibosaugos sistemos, ventiliacijos sistemos išvadų atnaujinimas bei lietaus nuotekų sistemų stovų bei magistralių keitimas. Numatyti eksploatacinius takus. Stogo šilumos perdavimo koeficientas po atnaujinimo mažesnis už 0,16 W/(m <sup>2</sup> ·K). Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Vadovautis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitais reikalavimais.	Investicijų suma - 60000 Eur, iš to skaičiaus: -stogo danga, 60000 Eur	<0,16 (įvertinus tvirtiklius)	stogo danga, 750 m <sup>2</sup> , 80 Eur/m <sup>2</sup> ,
5.1.5	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (dalis langų ir balkonų durų)	Dalis butų langų bei balkonų durų keičiami naujais, PVC profilio. Vadovautis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais.	Investicijų suma - 5616 Eur, iš to skaičiaus: -butų langai, 4482 Eur -butų balkonų durys, 1134 Eur	<1,30	butų langai, 49,8 m <sup>2</sup> , 17 vnt., 90 Eur/m <sup>2</sup> , butų balkonų durys, 12,6 m <sup>2</sup> , 8 vnt., 90 Eur/m <sup>2</sup> ,
5.1.6	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas	Seni laiptinių bei rūšio langai keičiami naujais, PVC profilio. Tambūrinės durys keičiamos naujomis. Įėjimo į pastatą pritaikymas neįgalųjų poreikiams. Projektavimo metu spęsti dėl atliekų konteinerio durų naikinimo. Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos	Investicijų suma - 8612 Eur, iš to skaičiaus: -langai, 6120 Eur -tambūrinės durys, 2492 Eur	Langų U<1,30 Durų U<1,60	langai, 68 m <sup>2</sup> , vnt., 90 Eur/m <sup>2</sup> , tambūrinės durys, 7 m <sup>2</sup> , vnt., 356 Eur/m <sup>2</sup> ,

		taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, kitais teisės aktais.			
5.2	Kitos priemonės				
5.2.1	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas. Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemas. Lauko inžineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.	Investicijų suma - 9960 Eur	-	vamzdynai, 240 m., 41,5 Eur/m.,



4.2 lentelė (pastato atnaujinimo priemonių paketas II)

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai			
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan.	Investicijos priemonės įgyvendinimui	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m <sup>2</sup> K) *	Darbų kiekis (m <sup>2</sup> , m, vnt.)
5.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės				
5.1.1	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (2)	<p>Šalinami visi šildymo sistemos elementai už šilumos mazgo ribų. Įrengiama nauja dvivamzdė, horizontali, kolektorinė šildymo sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-šildymo prietaisai keičiami naujais su integruotais termostatiniais vožtuvais su reguliatoriais (užpildas – dujinis, reguliavimo ribos - 16-23 oC),</li> <li>-rūsyje numatomi nauji magistraliniai vamzdynai su izoliacija,</li> <li>-numatomi stovai bei po vieną kolektorinės apskaitos spintelę kiekvienam butui su nuotoliniu duomenų nuskaitymu,</li> <li>-vamzdynai nešildomose patalpose izoliuojami akmens vatos izoliacija su aliuminio folijos danga,</li> <li>-stovų apačiose įrengiami automatiniai balansiniai vožtuvai su slėgio perkryčio reguliavimu bei sklendės stovų uždarymui bei vandens išleidimui.</li> </ul> <p>Esama buitinio karšto vandens sistema atnaujinama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-magistraliniai vamzdynai rūsyje keičiami naujais su akmens vatos izoliacija su aliuminio folija,</li> <li>-stovų (tiekimo ir cirkuliaciniai) vamzdynai keičiami naujais, izoliuotais,</li> <li>-stovų apačiose įrengiami terminio balansavimo vožtuvai su dezinfekcijos funkcija bei rutulinės sklendės stovų išleidimui bei atjungimui.</li> </ul> <p>Atliekamas sistemos praplovimas stovais, subalansavimas, balansavimo protokolų užpildymas bei stovų rūsyje sužymėjimas. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, kitų teisės aktų reikalavimus bei gerąją praktiką.</p>	<p>Investicijų suma - 150640 Eur, iš to skaičiaus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-šildymo sistemos radiatoriai su reguliavimo ventiliais ir termoreguliatoriais, 21900 Eur</li> <li>-šildymo sistemos rūsio magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 7250 Eur</li> <li>-šildymo sistemos stovų vamzdynai su izoliacija, 12600 Eur</li> <li>-šildymo sistemos skirstomieji plastikiniai butų vamzdynai, 21000 Eur</li> <li>-šildymo sistemos automatiniai balansiniai vožtuvai su slėgio perkryčio reguliavimu, 2250 Eur</li> <li>-kolektorinės šildymo sistemos apskaitos spintos su šilumos skaitikliu, balansavimo/uždaromąja armatūra, 67500 Eur</li> <li>-karšto vandens sistemos terminio balansavimo vožtuvai su rutulinėmis sklendėmis, 2160 Eur</li> <li>-karšto vandens sistemos magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 6240 Eur</li> <li>-karšto vandens sistemos stovų (tiekimo ir cirkuliaciniai) vamzdynai su izoliacija, 8640 Eur</li> <li>-sistemų subalansavimas, protokolų užpildymas, stovų sužymėjimas, 1100 Eur</li> </ul>	-	<p>šildymo sistemos radiatoriai su reguliavimo ventiliais ir termoreguliatoriais, 146 kompl., 150 Eur/kompl.,</p> <p>šildymo sistemos rūsio magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 290 m., 25 Eur/m.,</p> <p>šildymo sistemos stovų vamzdynai su izoliacija, 280 m., 45 Eur/m.,</p> <p>šildymo sistemos skirstomieji plastikiniai butų vamzdynai, 1400 m., 15 Eur/m.,</p> <p>šildymo sistemos automatiniai balansiniai vožtuvai su slėgio perkryčio reguliavimu, 9 kompl., 250 Eur/kompl.,</p> <p>kolektorinės šildymo sistemos apskaitos spintos su šilumos skaitikliu, balansavimo/uždaromąja armatūra, 45 kompl., 1500 Eur/kompl.,</p> <p>karšto vandens sistemos terminio balansavimo vožtuvai su rutulinėmis sklendėmis, 9 vnt., 240 Eur/vnt.,</p> <p>karšto vandens sistemos magistraliniai vamzdynai su izoliacija, 195 m. 32 Eur/m.</p> <p>karšto vandens sistemos stovų (tiekimo ir cirkuliaciniai) vamzdynai su izoliacija, 270 m. 32 Eur/m.</p> <p>sistemų subalansavimas, protokolų</p>

					užpildymas, stovų sužymėjimas, 1 kompl., 1100 Eur/kompl.,
5.1.2	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas+rekuperacija)	Patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas. Kiekvienam butui numatoma decentralizuota vėdinimo sistema su minirekuperatoriais bei valdymu. Pagal STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.	Investicijų suma - 72180 Eur, iš to skaičiaus: -patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas, 4680 Eur -decentralizuotos vėdinimo sistemos minirekuperatoriai, 67500 Eur	-	patalpų vėdinimo sistemos sutvarkymas, kanalų mechaninis/biocheminis išvalymas, 45 but., 104 Eur/but., decentralizuotos vėdinimo sistemos minirekuperatoriai, 90 vnt., 750 Eur/vnt.,
5.1.3	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas... (ventiliuojamas fasadas2)	Atliekamas išorinių sienų bei cokolio šiltinimas iš išorinės pusės išorine vėdinama termoizoliacine sistema. Defektų šalinimas. Šiltinimo įgilinimas 1,20 m. žemiau nuogrindos. Atnaujinama nuogrinda. Balkonų turėklinės plokštės atnaujinamos bei apšiltinamos. Įrengimas bei savybės turi atitikti STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“, ugniaatsparumo, gaisrinės saugos, atsparumo smūgiams, kitus reikalavimus. Sienų (cokolių) izoliuojančios savybės turi atitikti STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, kitus teisės aktus.	Investicijų suma - 345608 Eur, iš to skaičiaus: -sienos ir angokraščiai, 285048 Eur -cokolis, iki nuogrindos, 23280 Eur -cokolis, žemiau nuogrindos, 23280 Eur -balkonų turėklinės plokštės, 14000 Eur	<0,20 (įvertinus tvirtiklius)	sienos ir angokraščiai, 2375,4 m2, 120 Eur/m2, cokolis, iki nuogrindos, 194 m2, 120 Eur/m2, cokolis, žemiau nuogrindos, 194 m2, 120 Eur/m2, balkonų turėklinės plokštės, 140 m2, 100 Eur/m2,
5.1.4	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą (...), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Atliekamas plokščio stogo šiltinimas, keičiant esamą dangą nauja su termoizoliacijos plokštėmis, įrengiant bituminę dangą. Parapetų pakėlimas, šiltinimas. Žaibosaugos sistemos, ventiliacijos sistemos išvadų atnaujinimas bei lietaus nuotekų sistemų stovų bei magistralių keitimas. Numatyti eksploatacinius takus. Stogo šilumos perdavimo koeficientas po atnaujinimo mažesnis už 0,16 W/(m2 ·K). Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius statybos produktus. Vadovautis STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, „Gyvenamųjų namų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitais reikalavimais.	Investicijų suma - 60000 Eur, iš to skaičiaus: -stogo danga, 60000 Eur	<0,16 (įvertinus tvirtiklius)	stogo danga, 750 m2, 80 Eur/m2,

5.1.5	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (dalis langų ir balkonų durų)	Dalis butų langų bei balkonų durų keičiami naujais, PVC profilio. Vadovautis STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais.	Investicijų suma - 5616 Eur, iš to skaičiaus: -butų langai, 4482 Eur -butų balkonų durys, 1134 Eur	<1,30	butų langai, 49,8 m <sup>2</sup> , 17 vnt., 90 Eur/m <sup>2</sup> , butų balkonų durys, 12,6 m <sup>2</sup> , 8 vnt., 90 Eur/m <sup>2</sup> ,
5.1.6	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą (visi balkonai)	Atliekamas visų butų balkonų įstiklinimas per visą balkono aukštį. Balkonai stiklinami PVC profiliu. Įstiklintų balkonų varstoma dalis arba dalys turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima iki galo atverti iki balkono nevarstomos dalies ir stiklų išorinę pusę būtų galima išvalyti iš balkono vidaus. Varstomos dalys dviejų varstymo padėčių su trečia varstymo padėtimi (mikroventiliacija). Apdailos darbai, susiję su priemonės įgyvendinimo baigtiniais darbais. Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“, kitais teisės aktais.	Investicijų suma - 39690 Eur, iš to skaičiaus: -butų balkonų įstiklinimas, 39690 Eur	-	butų balkonų įstiklinimas, 294 m <sup>2</sup> , 135 Eur/m <sup>2</sup> ,
5.1.7	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas	Seni laiptinių bei rūšio langai keičiami naujais, PVC profilio. Tambūrinės durys keičiamos naujomis. Įėjimo į pastatą pritaikymas neįgaliųjų poreikiams. Projektavimo metu spręsti dėl atliekų konteinerio durų naikinimo. Vadovautis „Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, kitais teisės aktais.	Investicijų suma - 8612 Eur, iš to skaičiaus: -langai, 6120 Eur -tambūrinės durys, 2492 Eur	Langų U<1,30 Durų U<1,60	langai, 68 m <sup>2</sup> , vnt., 90 Eur/m <sup>2</sup> , tambūrinės durys, 7 m <sup>2</sup> , vnt., 356 Eur/m <sup>2</sup> ,
5.1.8	Rūšio perdangos šiltinimas	Perdangos tarp butų ir nešildomo rūšio šiltinamas termoizoliacinėmis plokštėmis. Perdangos šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis už 0,25 W/(m <sup>2</sup> ·K). Vadovautis „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, kitais teisės aktais.	Investicijų suma - 20800 Eur, iš to skaičiaus: -rūšio perdanga, 20800 Eur	<0,25	rūšio perdanga, 520 m <sup>2</sup> , 40 Eur/m <sup>2</sup> ,
5.2	Kitos priemonės				
5.2.1	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pastato šalto vandens tiekimo sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdinių keitimas. Numatyti stovų uždarymo armatūrą. Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.	Investicijų suma - 10800 Eur	-	vamzdynai, 240 m., 45 Eur/m.,

5.2.2	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	Pastato buitinių nuotekų sistemos magistralių rūsyje ir stovų vamzdynų keitimas. Pagal STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, kitus teisės aktus.	Investicijų suma - 9960 Eur	-	vamzdynai, 240 m., 41,5 Eur/m.,
-------	--	---	-----------------------------	---	---------------------------------

**Pastaba:** 4.1 ir 4.2 lentelėse pateikiami atnaujinimo darbų bei medžiagų kiekiai yra preliminarūs ir jokiais būdais ne baigtiniai. Šie kiekiai turi būti tikslinami bei pildomi projektavimo metu.

## 6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis		
			Esama padėtis	Planuojama: paketas I	Planuojama: paketas II
1	2	3	4	5	6
<b>PROJEKTO RODIKLIAI</b>					
6.1.	Pastato energinio naudingumo klasė	Klasė	E	C	C
6.2.	Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš jų pagal energiją taupančias priemones:	kWh/metus	518724,57	263144,70	263144,70
		kWh/m <sup>2</sup> /metus	223,54	113,40	113,40
6.2.1	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	kWh/m <sup>2</sup> /metus	103,45	13,45	13,45
6.2.2	Šilumos nuostoliai per pastato stogą	kWh/m <sup>2</sup> /metus	19,34	4,34	4,34
6.2.3	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su gruntu:	kWh/m <sup>2</sup> /metus			
6.2.5	- per grindis ant grunto	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00
6.2.6	- per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00
6.2.7	- per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00
6.2.8	- per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00
6.2.9	- per šildomo rūšio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00
6.2.10	- per grindis virš vėdinamų pogrindžių,	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00
6.2.11	- per grindis virš nešildomų vėdinamų pogrindžių,	kWh/m <sup>2</sup> /metus	8,62	2,62	2,62
6.2.12	Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras	kWh/m <sup>2</sup> /metus	31,27	21,27	21,27
6.2.13	Šilumos nuostoliai per pastato išorines įėjimo duris, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo	kWh/m <sup>2</sup> /metus	7,01	4,01	4,01
6.2.14	Šilumos nuostoliai per pastato ilginčius šiluminius tiltelius	kWh/m <sup>2</sup> /metus	16,12	4,12	4,12
6.2.15	Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo	kWh/m <sup>2</sup> /metus	22,10	22,10	22,10
6.2.16	Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00

6.2.17	Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	kWh/m <sup>2</sup> /metus	47,12	47,12	47,12
6.2.18	Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu	kWh/m <sup>2</sup> /metus	32,63	32,63	32,63
6.2.19	Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos prietekėjimai ir išorės ir vidiniai šilumos pritekėjimai	kWh/m <sup>2</sup> /metus	61,94	61,94	61,94
6.2.20	Suminės elektros energijos sąnaudos pastate	kWh/m <sup>2</sup> /metus	20,55	20,55	20,55
6.2.21	Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui	kWh/m <sup>2</sup> /metus	4,05	4,05	4,05
6.2.22	Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti	kWh/m <sup>2</sup> /metus	40,24	40,24	40,24
6.2.23	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti	kWh/m <sup>2</sup> /metus	223,54	113,40	113,40
6.2.24	Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti	kWh/m <sup>2</sup> /metus	0,00	0,00	0,00
6.3.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo)	procentais	–	49%	49%
6.4.	Išmetamo ŠESD (CO <sub>2</sub> ekv.) kiekio sumažėjimas	tonų/metus	–	28,63	28,63
<b>PROJEKTO ETAPO RODIKLIAI*</b>					
6.5.	Pastato energinio naudingumo klasė, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	klasė	–	–	–
6.6.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas palyginti su esamos padėties duomenimis, įgyvendinus pirmojo etapo priemones	procentais	–	–	–

## 7. Namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina

6 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina			
		I paketas		II paketas	
		tūkst. Eur	Eur/m <sup>2</sup> naudingojo (bendrojo) ploto	tūkst. Eur	Eur/m <sup>2</sup> naudingojo (bendrojo) ploto
1	2	3	4	5	6
7.1.	Energijos efektyvumą didinančios priemonės, iš viso: iš jų:	267,429800	115,25	703,146000	294,05
7.1.1	Rūsio perdangos šiltinimas	0,000000	0,00	20,80000	8,96

7.1.2	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus (dalis langų ir balkonų durų)	5,616000	2,42	5,61600	2,42
7.1.3	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas	8,612000	3,71	8,61200	3,71
7.1.4	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą (visi balkonai)	0,000000	0,00	39,69000	17,10
7.1.5	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas... (tinkuojamas fasadas)	178,750800	77,03	0,00000	0,00
7.1.6	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas... (ventiliuojamas fasadas2)	0,000000	0,00	345,60800	148,94
7.1.7	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą (...), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	60,000000	25,86	60,00000	25,86
7.1.8	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas+rekuperacija)	0,000000	0,00	72,18000	31,11
7.1.9	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas)	1,485000	0,64	0,00000	0,00
7.1.10	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (2)	0,000000	0,00	150,64000	64,92
7.1.11	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas (1)	12,966000	5,59	0,00000	0,00
7.2.	Kitos priemonės, iš viso: iš jų:	9,96000	4,29	20,76000	8,95
7.2.1	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	0,00000	0,00	10,80000	4,65
7.2.2	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	9,96000	4,29	9,96000	4,29
	Iš viso:	277,38980	119,54	723,90600	303,00
7.3	Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	3,6%		2,9%	

## 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

7 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Preliminari kaina, tūkst. Eur		Santykinė kaina, Eur/m <sup>2</sup>	
		I paketas	II paketas	I paketas	II paketas
1	2	3	4	4	6
8.1.	Statybos darbai, iš viso:	277,38980	723,90600	115,25	294,05
8.1.1.	Iš jų:				
	statybos darbai, tenkantis energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	267,42980	703,14600	115,25	294,05
8.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	19,41729	50,67342	8,37	21,84
8.3.	Statybos techninė priežiūra	5,54780	14,47812	2,39	6,24
8.4.	Projekto administravimas	6,17717	6,17717	2,66	2,66
	Galutinė suma:	308,53205	795,23471	128,67	324,79

**Pastaba:**

Projekto parengimo kaina – 7% nuo statybos darbų kainos.

Statybos techninės priežiūros kaina – 2% nuo statybos darbų kainos.

Projekto administravimas – 0,1 Eur/m<sup>2</sup>/mėn. + PVM. Lėšos numatomos 2017.03 iki 2018.12.

**9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas**

8 lentelė

Eil.nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Rodiklio reikšmė		Pastabos
			I paketas	II paketas	
1	2	3	4	5	5
9.1.	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas				
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	metais	37,9	97,6	
9.1.2.	atėmus valstybės paramą	metais	33,0	84,7	
9.2.	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas				
9.2.1.	pagal suminę kainą	metais	32,8	86,3	
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	metais	27,9	73,4	

**10. Projekto įgyvendinimo planas**

9 lentelė

Eil. Nr.	Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas	Darbų pradžia (metai, mėnuo)	Darbų pabaiga (metai, mėnuo)	Pastabos
1	2	3	4	5
10.1	Šildymo sistemos atnaujinimas (2)	2017.03	2018.12	
10.2	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą (kanalų pravalymas+rekuperacija)	2017.03	2018.12	
10.3	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas (Ventiliuojamas fasadas)	2017.03	2018.12	
10.4	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas. Naujos dangos įrengimas	2017.03	2018.12	
10.5	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas (dalis langų ir balkonų durų)	2017.03	2018.12	
10.6	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas (visi balkonai)	2017.03	2018.12	
10.7	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų keitimas	2017.03	2018.12	
10.8	Rūsio perdangos šiltinimas	2017.03	2018.12	
10.9	Geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas	2017.03	2018.12	
10.10	Buitinių nuotekų sistemos atnaujinimas ar keitimas	2017.03	2018.12	



## 11. Projekto finansavimo planas

10 lentelė

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamos lėšos		Planuojamos lėšos		Pastabas
		(I paketas)		(II paketas)		
		suma, tūkst. Eur	procentinė dalis nuo visos sumos, %	suma, tūkst. Eur	procentinė dalis nuo visos sumos, %	
1	2	3	4	5	6	7
11.1.	Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu					
11.1.1.	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	3,08859	1,00%	3,08859	0,39%	Lėšos skiriamos projekto administravimui nuo 2017.03.01 iki 2018.12.31
11.1.2.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	289,87234	93,95%	756,48177	95,13%	Kreditą sudaro lėšos rangos darbams bei 50 proc. lėšų projektui bei laikotarpiu nuo 2017.03.01 iki 2018.12.31 50 proc. lėšų statybos techninei priežiūrai
11.1.3.	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	15,57113	5,05%	35,66436	4,48%	
11.1.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0,00	0,00%	0,00	0,000%	
		308,53205	100%	795,23471	100%	
11.2.	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:				3	
11.2.1.	projekto parengimo išlaidų kompensavimas	9,70864	50%	25,33671	50%	50% parama
11.2.2.	statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	2,77390	50%	7,23906	50%	50% parama
11.2.3.	projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	3,08859	50%	3,08859	50%	50% parama
11.2.4.	valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:					
11.2.4.1.	valstybės parama kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	40,11447	15%	105,47190	15%	

11.2.4.2.	<p>papildoma Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama kompensuojant išlaidas, tenkančias energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, kai po pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mažesnis kaip 40 proc. energinis efektyvumas, palyginti su pastato energiniu efektyvumu prieš pastato atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą</p>	40,11447	15%	105,47190	15%	<p>15 procentų, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendinamas po 2017 m. gruodžio 31 dienos, bet ne vėliau 2020.12.31; jeigu įgyvendinus projektą pasiekiami ne mažesni kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo</p>
11.3.	<p>Preliminarus laikotarpis, per kurį valstybės parama kompensuojant 15 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, suteikiama nurašant lengvatinio kredito palūkanas iki 0 procentų, kol bendra nurašytų lengvatinio kredito palūkanų suma pasiekia apskaičiuotą 15 procentų sumą, nurodytą 10 lentelės 11.2.4.1 papunktyje, mėnesiais</p>	100		101		

**Pastaba:** 11.3 punkte minimo laikotarpio apskaičiavimo pagrindimas pateiktas priede nr. 6.

## 12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

### Atnaujinimo priemonių paketas I

11.1 lentelė

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendrasis) plotas, m2	Investicijų suma, Eur:			Valstybės parama, Eur:		Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur (6-7)	Kredito suma, Eur, įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir (ar) statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinus valstybės paramą	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m2, įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir (ar) statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinant valstybės paramą projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti ir lengvatinio kredito palūkanų nurašymą iki 0 proc.	Pastabos
			bendrujų	individualių	iš viso	Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama	kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.1	Butas Nr. 1	49,77	6498,08	0,00	6498,08	842,48	842,48	5655,60	6097,87	0,51	
12.1.2	Butas Nr. 2	36,28	4745,74	0,00	4745,74	615,47	615,47	4130,27	4454,01	0,51	
12.1.3	Butas Nr. 3	64,12	8362,14	0,00	8362,14	1083,96	1083,96	7278,18	7846,53	0,51	
12.1.4	Butas Nr. 4	49,77	6498,08	0,00	6498,08	842,48	842,48	5655,60	6097,87	0,51	
12.1.5	Butas Nr. 5	36,28	4745,74	0,00	4745,74	615,47	615,47	4130,27	4454,01	0,51	
12.1.6	Butas Nr. 6	64,12	8362,14	0,00	8362,14	1083,96	1083,96	7278,18	7846,53	0,51	
12.1.7	Butas Nr. 7	49,77	6498,08	0,00	6498,08	842,48	842,48	5655,60	6097,87	0,51	
12.1.8	Butas Nr. 8	36,28	4745,74	0,00	4745,74	615,47	615,47	4130,27	4454,01	0,51	
12.1.9	Butas Nr. 9	64,12	8362,14	0,00	8362,14	1083,96	1083,96	7278,18	7846,53	0,51	
12.1.10	Butas Nr. 10	49,77	6498,08	909,00	7407,08	978,83	978,83	6428,25	7006,87	0,59	
12.1.11	Butas Nr. 11	36,28	4745,74	0,00	4745,74	615,47	615,47	4130,27	4454,01	0,51	
12.1.12	Butas Nr. 12	64,12	8362,14	1026,00	9388,14	1237,86	1237,86	8150,28	8872,53	0,58	
12.1.13	Butas Nr. 13	49,77	6498,08	0,00	6498,08	842,48	842,48	5655,60	6097,87	0,51	

12.1.14	Butas Nr. 14	36,28	4745,74	0,00	4745,74	615,47	615,47	4130,27	4454,01	0,51	
12.1.15	Butas Nr. 15	64,12	8362,14	0,00	8362,14	1083,96	1083,96	7278,18	7846,53	0,51	
12.1.16	Butas Nr. 16	50,11	6542,25	909,00	7451,25	984,55	984,55	6466,70	7048,30	0,59	
12.1.17	Butas Nr. 17	36,14	4727,56	0,00	4727,56	613,11	613,11	4114,44	4436,95	0,51	
12.1.18	Butas Nr. 18	64,07	8355,64	0,00	8355,64	1083,12	1083,12	7272,52	7840,44	0,51	
12.1.19	Butas Nr. 19	50,11	6542,25	909,00	7451,25	984,55	984,55	6466,70	7048,30	0,59	
12.1.20	Butas Nr. 20	36,14	4727,56	0,00	4727,56	613,11	613,11	4114,44	4436,95	0,51	
12.1.21	Butas Nr. 21	64,07	8355,64	0,00	8355,64	1083,12	1083,12	7272,52	7840,44	0,51	
12.1.22	Butas Nr. 22	50,11	6542,25	0,00	6542,25	848,20	848,20	5694,05	6139,30	0,51	
12.1.23	Butas Nr. 23	36,14	4727,56	540,00	5267,56	694,11	694,11	4573,44	4976,95	0,57	
12.1.24	Butas Nr. 24	64,07	8355,64	0,00	8355,64	1083,12	1083,12	7272,52	7840,44	0,51	
12.1.25	Butas Nr. 25	50,11	6542,25	0,00	6542,25	848,20	848,20	5694,05	6139,30	0,51	
12.1.26	Butas Nr. 26	36,14	4727,56	0,00	4727,56	613,11	613,11	4114,44	4436,95	0,51	
12.1.27	Butas Nr. 27	64,07	8355,64	0,00	8355,64	1083,12	1083,12	7272,52	7840,44	0,51	
12.1.28	Butas Nr. 28	50,11	6542,25	495,00	7037,25	922,45	922,45	6114,80	6634,30	0,55	
12.1.29	Butas Nr. 29	36,14	4727,56	0,00	4727,56	613,11	613,11	4114,44	4436,95	0,51	
12.1.30	Butas Nr. 30	64,07	8355,64	0,00	8355,64	1083,12	1083,12	7272,52	7840,44	0,51	
12.1.31	Butas Nr. 31	49,93	6518,87	0,00	6518,87	845,17	845,17	5673,70	6117,37	0,51	
12.1.32	Butas Nr. 32	49,95	6521,46	0,00	6521,46	845,51	845,51	5675,96	6119,80	0,51	
12.1.33	Butas Nr. 33	63,73	8311,47	495,00	8806,47	1151,65	1151,65	7654,83	8294,01	0,54	
12.1.34	Butas Nr. 34	49,93	6518,87	0,00	6518,87	845,17	845,17	5673,70	6117,37	0,51	
12.1.35	Butas Nr. 35	49,95	6521,46	0,00	6521,46	845,51	845,51	5675,96	6119,80	0,51	
12.1.36	Butas Nr. 36	63,73	8311,47	0,00	8311,47	1077,40	1077,40	7234,08	7799,01	0,51	
12.1.37	Butas Nr. 37	49,93	6518,87	0,00	6518,87	845,17	845,17	5673,70	6117,37	0,51	
12.1.38	Butas Nr. 38	49,95	6521,46	0,00	6521,46	845,51	845,51	5675,96	6119,80	0,51	
12.1.39	Butas Nr. 39	63,73	8311,47	0,00	8311,47	1077,40	1077,40	7234,08	7799,01	0,51	
12.1.40	Butas Nr. 40	49,93	6518,87	0,00	6518,87	845,17	845,17	5673,70	6117,37	0,51	
12.1.41	Butas Nr. 41	49,95	6521,46	0,00	6521,46	845,51	845,51	5675,96	6119,80	0,51	

12.1.42	Butas Nr. 42	63,73	8311,47	0,00	8311,47	1077,40	1077,40	7234,08	7799,01	0,51	
12.1.43	Butas Nr. 43	49,93	6518,87	0,00	6518,87	845,17	845,17	5673,70	6117,37	0,51	
12.1.44	Butas Nr. 44	49,95	6521,46	0,00	6521,46	845,51	845,51	5675,96	6119,80	0,51	
12.1.45	Butas Nr. 45	63,73	8311,47	333,00	8644,47	1127,35	1127,35	7517,13	8132,01	0,53	
Iš viso:		2320,50	302916,05	5616,00	308532,05	40114,47	40114,47	268417,58	289872,34		

Atnaujinimo priemonių paketas II

11.2 lentelė

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingas (bendrasis) plotas, m2	Investicijų suma, Eur:			Valstybės parama, Eur:		Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur (6-7)	Kredito suma, Eur, įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir (ar) statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinus valstybės paramą	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m2, įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir (ar) statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinant valstybės paramą projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti ir lengvatinio kredito palūkanų nurašymą iki 0 proc.	Pastabos
			bendrųjų	individualių	iš viso	Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama valstybės parama	kompensuojant 15 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.1	Butas Nr. 1	49,77	14640,33	2269,50	16909,83	2240,21	2240,21	14669,62	16078,66	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.2	Butas Nr. 2	36,28	10700,30	2269,50	12969,80	1729,51	1729,51	11240,30	12363,92	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.3	Butas Nr. 3	64,12	18831,54	2607,00	21438,54	2834,09	2834,09	18604,44	20367,72	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.4	Butas Nr. 4	49,77	14640,33	2269,50	16909,83	2240,21	2240,21	14669,62	16078,66	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.5	Butas Nr. 5	36,28	10700,30	2269,50	12969,80	1729,51	1729,51	11240,30	12363,92	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.6	Butas Nr. 6	64,12	18831,54	2607,00	21438,54	2834,09	2834,09	18604,44	20367,72	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.7	Butas Nr. 7	49,77	14640,33	2269,50	16909,83	2240,21	2240,21	14669,62	16078,66	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.8	Butas Nr. 8	36,28	10700,30	2269,50	12969,80	1729,51	1729,51	11240,30	12363,92	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui

12.1.9	Butas Nr. 9	64,12	18831,54	2607,00	21438,54	2834,09	2834,09	18604,44	20367,72	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.10	Butas Nr. 10	49,77	14640,33	3178,50	17818,83	2376,56	2376,56	15442,27	16987,66	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.11	Butas Nr. 11	36,28	10700,30	2269,50	12969,80	1729,51	1729,51	11240,30	12363,92	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.12	Butas Nr. 12	64,12	18831,54	3633,00	22464,54	2987,99	2987,99	19476,54	21393,72	1,39	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.13	Butas Nr. 13	49,77	14640,33	2269,50	16909,83	2240,21	2240,21	14669,62	16078,66	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.14	Butas Nr. 14	36,28	10700,30	2269,50	12969,80	1729,51	1729,51	11240,30	12363,92	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.15	Butas Nr. 15	64,12	18831,54	2607,00	21438,54	2834,09	2834,09	18604,44	20367,72	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.16	Butas Nr. 16	50,11	14739,63	3178,50	17918,13	2389,43	2389,43	15528,70	17081,28	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.17	Butas Nr. 17	36,14	10659,41	2269,50	12928,91	1724,21	1724,21	11204,71	12325,37	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.18	Butas Nr. 18	64,07	18816,93	2607,00	21423,93	2832,20	2832,20	18591,73	20353,95	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.19	Butas Nr. 19	50,11	14739,63	3178,50	17918,13	2389,43	2389,43	15528,70	17081,28	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.20	Butas Nr. 20	36,14	10659,41	2269,50	12928,91	1724,21	1724,21	11204,71	12325,37	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.21	Butas Nr. 21	64,07	18816,93	2607,00	21423,93	2832,20	2832,20	18591,73	20353,95	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.22	Butas Nr. 22	50,11	14739,63	2269,50	17009,13	2253,08	2253,08	14756,05	16172,28	1,34	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui

12.1.23	Butas Nr. 23	36,14	10659,41	2809,50	13468,91	1805,21	1805,21	11663,71	12865,37	1,48	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.24	Butas Nr. 24	64,07	18816,93	2607,00	21423,93	2832,20	2832,20	18591,73	20353,95	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.25	Butas Nr. 25	50,11	14739,63	2269,50	17009,13	2253,08	2253,08	14756,05	16172,28	1,34	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.26	Butas Nr. 26	36,14	10659,41	2269,50	12928,91	1724,21	1724,21	11204,71	12325,37	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.27	Butas Nr. 27	64,07	18816,93	2607,00	21423,93	2832,20	2832,20	18591,73	20353,95	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.28	Butas Nr. 28	50,11	14739,63	2764,50	17504,13	2327,33	2327,33	15176,80	16667,28	1,39	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.29	Butas Nr. 29	36,14	10659,41	2269,50	12928,91	1724,21	1724,21	11204,71	12325,37	1,42	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.30	Butas Nr. 30	64,07	18816,93	2607,00	21423,93	2832,20	2832,20	18591,73	20353,95	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.31	Butas Nr. 31	49,93	14687,06	2269,50	16956,56	2246,26	2246,26	14710,30	16122,72	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.32	Butas Nr. 32	49,95	14692,90	2269,50	16962,40	2247,02	2247,02	14715,38	16128,22	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.33	Butas Nr. 33	63,73	18717,63	3102,00	21819,63	2893,58	2893,58	18926,05	20755,32	1,36	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.34	Butas Nr. 34	49,93	14687,06	2269,50	16956,56	2246,26	2246,26	14710,30	16122,72	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.35	Butas Nr. 35	49,95	14692,90	2269,50	16962,40	2247,02	2247,02	14715,38	16128,22	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.36	Butas Nr. 36	63,73	18717,63	2607,00	21324,63	2819,33	2819,33	18505,30	20260,32	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui



12.1.37	Butas Nr. 37	49,93	14687,06	2269,50	16956,56	2246,26	2246,26	14710,30	16122,72	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.38	Butas Nr. 38	49,95	14692,90	2269,50	16962,40	2247,02	2247,02	14715,38	16128,22	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.39	Butas Nr. 39	63,73	18717,63	2607,00	21324,63	2819,33	2819,33	18505,30	20260,32	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.40	Butas Nr. 40	49,93	14687,06	2269,50	16956,56	2246,26	2246,26	14710,30	16122,72	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.41	Butas Nr. 41	49,95	14692,90	2269,50	16962,40	2247,02	2247,02	14715,38	16128,22	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.42	Butas Nr. 42	63,73	18717,63	2607,00	21324,63	2819,33	2819,33	18505,30	20260,32	1,32	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.43	Butas Nr. 43	49,93	14687,06	2269,50	16956,56	2246,26	2246,26	14710,30	16122,72	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.44	Butas Nr. 44	49,95	14692,90	2269,50	16962,40	2247,02	2247,02	14715,38	16128,22	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
12.1.45	Butas Nr. 45	63,73	18717,63	2940,00	21657,63	2869,28	2869,28	18788,35	20593,32	1,35	Mėnesinė įmoka viršija didžiausią leistiną II paketui
Iš viso:		2320,50	682428,71	112806,00	795234,71	105471,90	105471,90	689762,81	756481,77		

13. Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis:



13.1. mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: I paketui – 0,95 Eur/m<sup>2</sup>/mėn. II paketui – 0,95 Eur/m<sup>2</sup>/mėn. .;

13.2. mėnesinės įmokos dydis, įvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtaką: I paketui – 1,04 Eur/m<sup>2</sup>/mėn., II paketui – 1,04 Eur/m<sup>2</sup>/mėn.

Skaičiavime naudojama šilumos kaina – 6,63 ct/kWh.

14. Preliminarus kredito grąžinimo laikotarpis pirmam ir antram paketams – po 20 metų.

Investicijų ekonominis naudingumo grafinis atvaizdavimas pateiktas žemiau esančiuose grafikuose. Pateikiamų skaičių matavimo vienetas – kWh/m<sup>2</sup> naudingojo ploto.

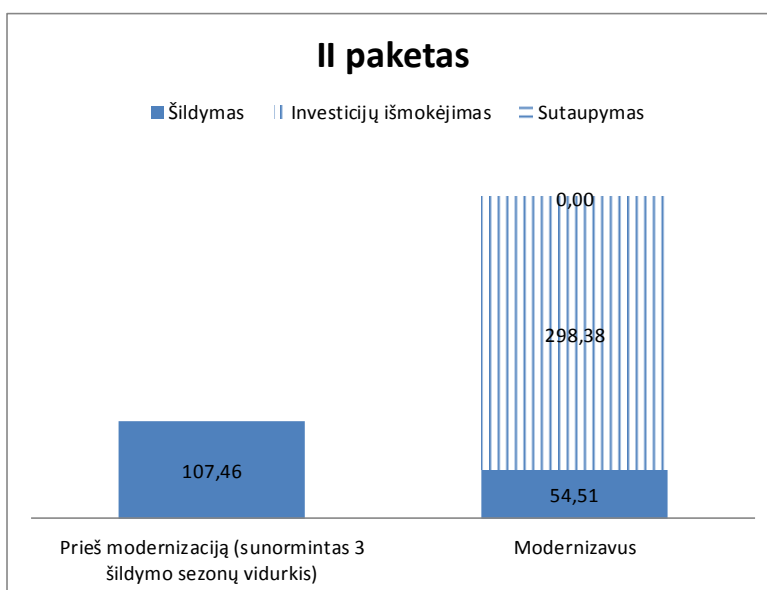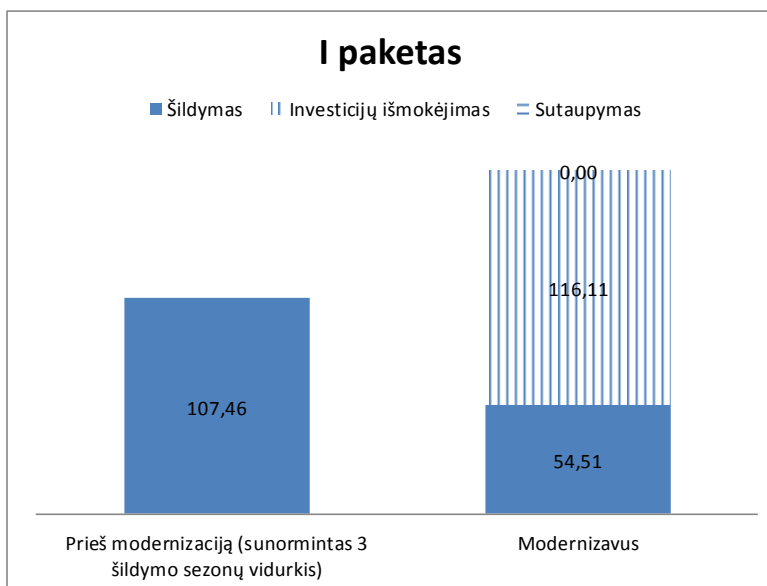

**Pastaba:** ekonominis naudingumas vertintas pagal faktines (ne sertifikato) sunormintas šilumos sąnaudas šildymui prieš pastato atnaujinimą (107,46 kWh/m<sup>2</sup>/metus) bei prognozuojamas pastato šilumos sąnaudas šildymui po atnaujinimo (54,51 kWh/m<sup>2</sup>/metus I paketui ir 54,51 kWh/m<sup>2</sup>/metus

II paketui; prognozuojamas sąnaudų sumažėjimas – 49% (I paketui ir 49% II paketui). Skaičiavime naudojama šilumos kaina – 6,63 ct/kWh.

**Individualūs darbai pagal butus**

12.1 lentelė. I paketas

Patalpos numeris	Patalpos plotas	Patalpos keičiamų langų kiekis, vnt.	Patalpos keičiamų langų plotas, m2	Patalpos keičiamų balkono durų kiekis, vnt.	Patalpos keičiamų balkono durų plotas, m2	Patalpos balkono įstiklinimo plotas, m2
1	49,77	0	0,00	0	0,00	5,70
2	36,28	0	0,00	0	0,00	5,70
3	64,12	0	0,00	0	0,00	8,20
4	49,77	0	0,00	0	0,00	5,70
5	36,28	0	0,00	0	0,00	5,70
6	64,12	0	0,00	0	0,00	8,20
7	49,77	0	0,00	0	0,00	5,70
8	36,28	0	0,00	0	0,00	5,70
9	64,12	0	0,00	0	0,00	8,20
10	49,77	3	8,30	1	1,80	5,70
11	36,28	0	0,00	0	0,00	5,70
12	64,12	3	9,60	1	1,80	8,20
13	49,77	0	0,00	0	0,00	5,70
14	36,28	0	0,00	0	0,00	5,70
15	64,12	0	0,00	0	0,00	8,20
16	50,11	3	8,30	1	1,80	5,70
17	36,14	0	0,00	0	0,00	5,70
18	64,07	0	0,00	0	0,00	8,20
19	50,11	3	8,30	1	1,80	5,70
20	36,14	0	0,00	0	0,00	5,70
21	64,07	0	0,00	0	0,00	8,20
22	50,11	0	0,00	0	0,00	5,70
23	36,14	2	4,20	1	1,80	5,70
24	64,07	0	0,00	0	0,00	8,20
25	50,11	0	0,00	0	0,00	5,70
26	36,14	0	0,00	0	0,00	5,70
27	64,07	0	0,00	0	0,00	8,20
28	50,11	1	3,70	1	1,80	5,70
29	36,14	0	0,00	0	0,00	5,70
30	64,07	0	0,00	0	0,00	8,20
31	49,93	0	0,00	0	0,00	5,70
32	49,95	0	0,00	0	0,00	5,70
33	63,73	1	3,70	1	1,80	8,20
34	49,93	0	0,00	0	0,00	5,70
35	49,95	0	0,00	0	0,00	5,70
36	63,73	0	0,00	0	0,00	8,20
37	49,93	0	0,00	0	0,00	5,70
38	49,95	0	0,00	0	0,00	5,70

39	63,73	0	0,00	0	0,00	8,20
40	49,93	0	0,00	0	0,00	5,70
41	49,95	0	0,00	0	0,00	5,70
42	63,73	0	0,00	0	0,00	8,20
43	49,93	0	0,00	0	0,00	5,70
44	49,95	0	0,00	0	0,00	5,70
45	63,73	1	3,70	1	0,00	8,20
Iš viso:	2320,50	17	49,80	8	12,60	294,00

12.2 lentelė. II paketas

Patalpos numeris	Patalpos plotas	Minirekuperatoriai, vnt.	Patalpos keičiamų langų kiekis, vnt.	Patalpos keičiamų langų plotas, m2	Patalpos keičiamų balkono durų kiekis, vnt.	Patalpos keičiamų balkono durų plotas, m2	Patalpos balkono įstiklinimo plotas, m2
1	49,77	2	0	0,00	0	0,00	5,70
2	36,28	2	0	0,00	0	0,00	5,70
3	64,12	2	0	0,00	0	0,00	8,20
4	49,77	2	0	0,00	0	0,00	5,70
5	36,28	2	0	0,00	0	0,00	5,70
6	64,12	2	0	0,00	0	0,00	8,20
7	49,77	2	0	0,00	0	0,00	5,70
8	36,28	2	0	0,00	0	0,00	5,70
9	64,12	2	0	0,00	0	0,00	8,20
10	49,77	2	3	8,30	1	1,80	5,70
11	36,28	2	0	0,00	0	0,00	5,70
12	64,12	2	3	9,60	1	1,80	8,20
13	49,77	2	0	0,00	0	0,00	5,70
14	36,28	2	0	0,00	0	0,00	5,70
15	64,12	2	0	0,00	0	0,00	8,20
16	50,11	2	3	8,30	1	1,80	5,70
17	36,14	2	0	0,00	0	0,00	5,70
18	64,07	2	0	0,00	0	0,00	8,20
19	50,11	2	3	8,30	1	1,80	5,70
20	36,14	2	0	0,00	0	0,00	5,70
21	64,07	2	0	0,00	0	0,00	8,20
22	50,11	2	0	0,00	0	0,00	5,70
23	36,14	2	2	4,20	1	1,80	5,70
24	64,07	2	0	0,00	0	0,00	8,20
25	50,11	2	0	0,00	0	0,00	5,70
26	36,14	2	0	0,00	0	0,00	5,70
27	64,07	2	0	0,00	0	0,00	8,20
28	50,11	2	1	3,70	1	1,80	5,70
29	36,14	2	0	0,00	0	0,00	5,70
30	64,07	2	0	0,00	0	0,00	8,20

31	49,93	2	0	0,00	0	0,00	5,70
32	49,95	2	0	0,00	0	0,00	5,70
33	63,73	2	1	3,70	1	1,80	8,20
34	49,93	2	0	0,00	0	0,00	5,70
35	49,95	2	0	0,00	0	0,00	5,70
36	63,73	2	0	0,00	0	0,00	8,20
37	49,93	2	0	0,00	0	0,00	5,70
38	49,95	2	0	0,00	0	0,00	5,70
39	63,73	2	0	0,00	0	0,00	8,20
40	49,93	2	0	0,00	0	0,00	5,70
41	49,95	2	0	0,00	0	0,00	5,70
42	63,73	2	0	0,00	0	0,00	8,20
43	49,93	2	0	0,00	0	0,00	5,70
44	49,95	2	0	0,00	0	0,00	5,70
45	63,73	2	1	3,70	1	0,00	8,20
Iš viso:	2320,50	90	17	49,80	8,00	12,60	294,00

---
